


- STEP2-1
- ・既設防災倉庫、既設研修センター内物品移設(別途)
 - ・門まわり先行撤去
 - ・仮囲い、仮設ゲート設置
 - ・既設防災倉庫、既設研修センター撤去

仮設計画 凡例	
	新築建物他
	既設解体建物他
	既設移設物
	先行撤去範囲
	交通誘導員 (STEP2:10ヶ月)
	養生鉄板 1,524×6,069 厚み22mm敷き
	仮囲い(万能鋼板)H2,000 全長120m(STEP1から残置28m、残置92m)余り25m
	パネルゲートW6,000×H1,800
	工事車両進入路を示す
	住民一般利用着動線を示す

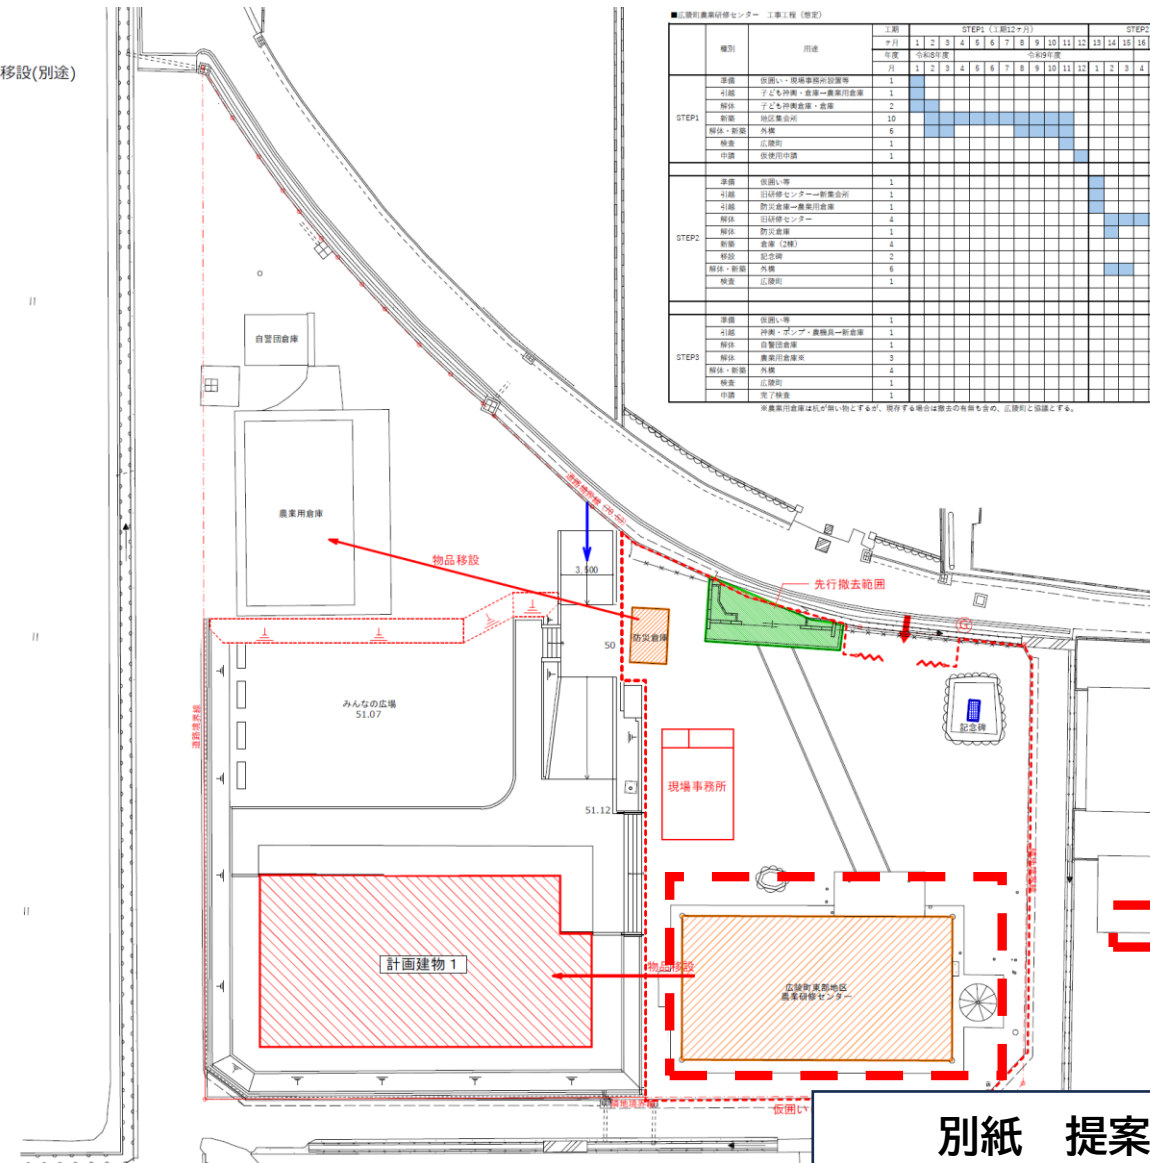

■広域村農業研修センター 工事工程 (予定)

種別	用途	工期 年度	STEP1 (上期12ヶ月)												STEP2 (上期10ヶ月)												STEP3 (上期7ヶ月)														
			令和8年度												令和9年度												令和10年度														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
STEP1	準備	仮囲い・現場事務所設置等	1																																						
	引継	子ども読書・倉庫→農業用倉庫	1																																						
	解体	子ども読書倉庫・倉庫	2																																						
	撤去	地区事務所	10																																						
	解体・新築	外構	6																																						
STEP2	解体	広域村	1																																						
	申請	仮使用申請	1																																						
	準備	仮囲い等	1																																						
	引継	引継センター→新築倉庫	1																																						
	解体	防災倉庫→農業用倉庫	1																																						
STEP3	解体	防災倉庫	4																																						
	解体	倉庫(2棟)	4																																						
	解体	倉庫	2																																						
	解体・新築	記念館	2																																						
	解体・新築	外構	6																																						
STEP4	解体	広域村	1																																						
	申請	仮使用申請	1																																						
	準備	仮囲い等	1																																						
	引継	引継・ポンプ・農機具→新倉庫	1																																						
	解体	倉庫管理倉庫	1																																						
STEP5	解体	農業用倉庫東	3																																						
	解体・新築	外構	4																																						
	解体	広域村	1																																						
	解体	完了検査	1																																						
	申請	完了検査	1																																						

※農業用倉庫は元が狭い物とするが、既存する場合は撤去の有無も含め、広域村と協議とする。

技術提案箇所

別紙 提案対策箇所図1
