


- STEP3-1
- ・自営団倉庫、農機具倉庫物品移設(別途)
- ・仮囲い、仮設ゲート設置
- ・自営団倉庫、農機具倉庫撤去

仮設計画 凡例	
	新築建物他
	既設解体建物他
	既設移設物
	先行撤去範囲
	交通誘導員(STEP3:5ヶ月)
	養生鉄板 1,524×6,069 厚み22mm敷き
	仮囲い(万能鋼板)H2,000
	全長90m(STEP2より移設)、余り30m
	パネルゲートW6,000×H1,800
	工事車両進入路を示す
	住民一般利用着動線を示す

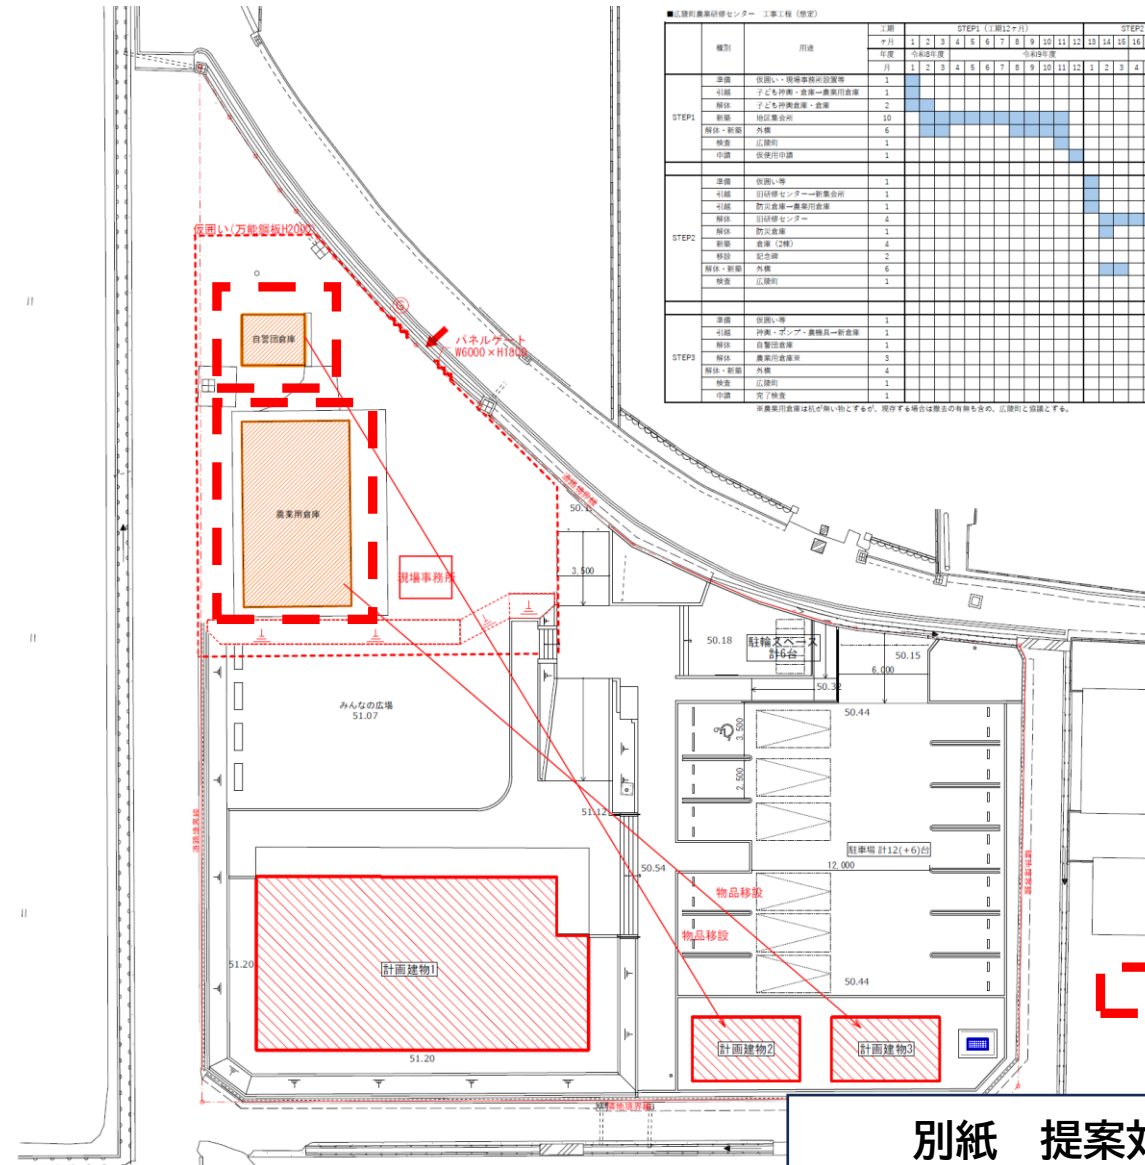

■三陸町農業研修センター 工事工程 (想定)		STEP1 (3期12ヶ月)												STEP2 (1期18ヶ月)												STEP3 (1期6ヶ月)											
工程	用途	令和5年度												令和6年度												令和7年度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STEP1	準備	仮囲い、現場事務所設置等	1																																		
	引越	子ども拝観・倉庫→農業用倉庫	1																																		
	解体	子ども拝観倉庫・倉庫	2																																		
	新築	地区集会所	10																																		
	解体・新築	外観	6																																		
	検査	広域利	1																																		
	申請	仮使用申請	1																																		
STEP2	準備	仮囲い等	1																																		
	引越	三陸研修センター(新築倉庫)	1																																		
	引越	防犯倉庫→農業用倉庫	1																																		
	解体	三陸研修センター	4																																		
	解体	防犯倉庫	1																																		
	新築	倉庫 (2棟)	4																																		
	解体	記念碑	2																																		
	解体・新築	外観	6																																		
検査	広域利	1																																			
STEP3	準備	仮囲い等	1																																		
	引越	防犯→ゾーンA・農機具一般倉庫	1																																		
	解体	自警団倉庫	1																																		
	引越	農業用倉庫A	3																																		
	解体・新築	外観	4																																		
	検査	広域利	1																																		
	申請	完了検査	1																																		

※農業用倉庫は引が無い物とするが、仮存する場合は撤去の有無を定め、広域利と協議とする。

技術提案箇所

別紙 提案対策箇所図2
